

RAPPORTO DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Data: 18-11-2025 — Ora: 14:06:00

Ubicazione cantiere:
RIF. SCALISE FRANCESCO VIA ROVIGNO UDINE

Descrizione commessa:
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Numero Commessa	Data Verbale	Intestatario/Indirizzo commessa
2024-245-SICANT	18-11-2025	SCALISE FRANCESCO VIA ROVIGNO, 20 UDINE UD

Compilatore
Fabio Rendace
CSE
**Alessandro Della
Vedova**

Funzione ricoperta
ASSISTENTE AL CSE
CSP
Alessandro Della Vedova

2 — ARGOMENTI DISCUSSI/STATO CANTIERE

La nuova intonaci presente in cantiere. Lavori di cappotto esterno, ponteggio non adeguato. Il cantiere resta sospeso per mancata documentazione e non autorizzazioni di accesso

3 — SEGNALAZIONI/VIOLAZIONI

Mancata delimitazione/protezione/segnalazione di aree pericolose/aperture verso il vuoto
Uso di ponteggio non conforme alle vigenti normative / mancato rispetto procedure d'uso/manutenzione
Lavori in quota non in conformità alle procedure di sicurezza
Mancanza di documentazione obbligatoria o documentazione incompleta
Lavorazioni svolte in difformità da quanto previsto dal PSC ed allegati
Ponteggio non fissato, ponteggio instabile e insicuro. Ripristinare la sicurezza dello stesso prima del suo utilizzo. Cantiere sospeso per mancati

4 — PRESCRIZIONI

Sistemare ponteggi come da PIMUS e vigenti normative

5 — PERSONALE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE

Voce	Q.tà
Operaio Generico	3
Bagno chimico	1
Ponteggio	1

6 — ORDINI DI SERVIZIO

Ordini di Servizio: Tutte le lavorazioni sono sospese
Termine: 2 giorni dalla data del presente verbale

7 — NOTE

Ove non espressamente giustificato e/o contestato entro 24 ore dalla ricezione del presente verbale, lo stesso si ritiene interamente accettato e sottoscritto dalle parti interessate.

Per quanto non detto o scritto, si rimanda al PSC, DVR e relative procedure ed allegati.

Con la presente, il/i referente/i della/e impresa/e esecutrice/i richiamata/e in calce dichiara/no che tutti gli addetti operanti in cantiere a servizio e/o per conto della/e propria/e impresa/e sono gestiti con le forme regolamentate e previste dalle vigenti normative.

Qualora alcune o tutte le lavorazioni siano state sospese per i motivi esposti nel presente verbale, le stesse potranno essere riprese solo a seguito di comunicazione in forma scritta (da parte del soggetto inadempiente) dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni indicate.

La sottoscrizione del presente Verbale costituisce accettazione integrale di quanto ivi riportato e diviene parte integrante del PSC.

8 — FIRME E SOTTOSCRIZIONI DEI PRESENTI

Impresa
Sigesta srl

Nome e Cognome
Fabio Rendace


Firma



Altro

—

Galleria Fotografica

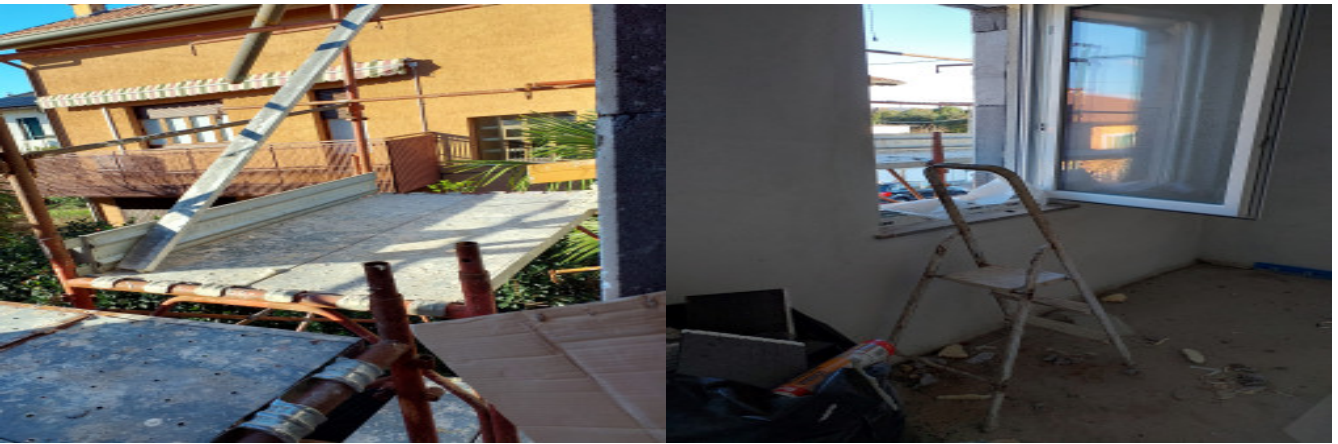

Galleria Fotografica

